
3.4 Baseline


Baseline adalah suatu bentuk perencanaan (*scope, time/schedule, cost*) yangtelah disetujui dan ditetapkan dalam suatu proyek. Digunakan sebagai acuan dan perbandingan antara rencana kerja yang telah ditetapkan dengan kenyataan di lapangan. Langkah-langkah membuat baseline adalah sebagai berikut:

a. Klik menu *project*.
b. Klik perintah *set baseline.*
c. Klik sub-perintah *set baseline*.
d. Kemudian muncul *windows set baseline*.
e. Pilih bagian *set baseline*, dengan pilihan *baseline* (dapat dibuat lebih dari 1 baseline, dengan nama baseline yang berbeda, dengan maksud untuk mengetahui bagaimana proyek berubah sepanjang waktu).
f. Pada bagian *for*, pilih *entire project* (agar *baseline* dibuat untuk keseluruhan proyek).
g. Klik *OK.*

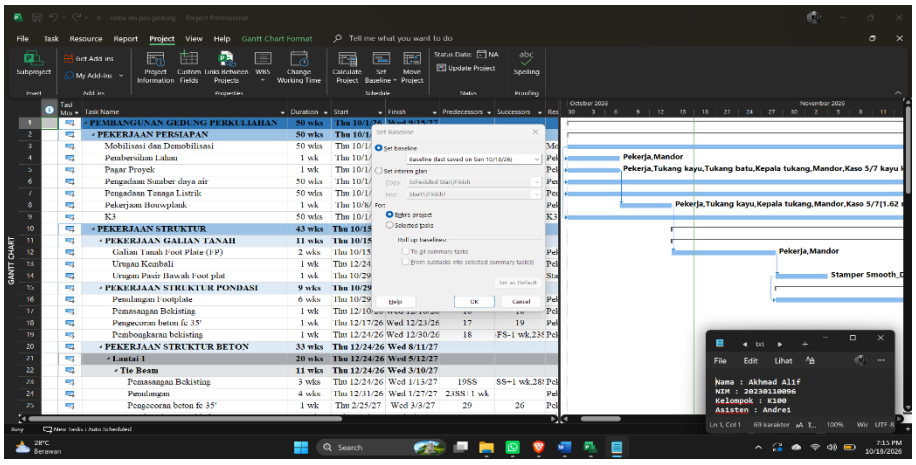

Gambar 3. 23 Tampilan *Set Baseline*

Kemudian tampilkan lintasan kritis dengan cara klik kanan pada bagian *GanttChart*, kemudian pilih *show/hide bar style*, kemudian klik *Critical Task*. Maka tampilan *Gantt Chart* akan seperti pada gambar 3.24.

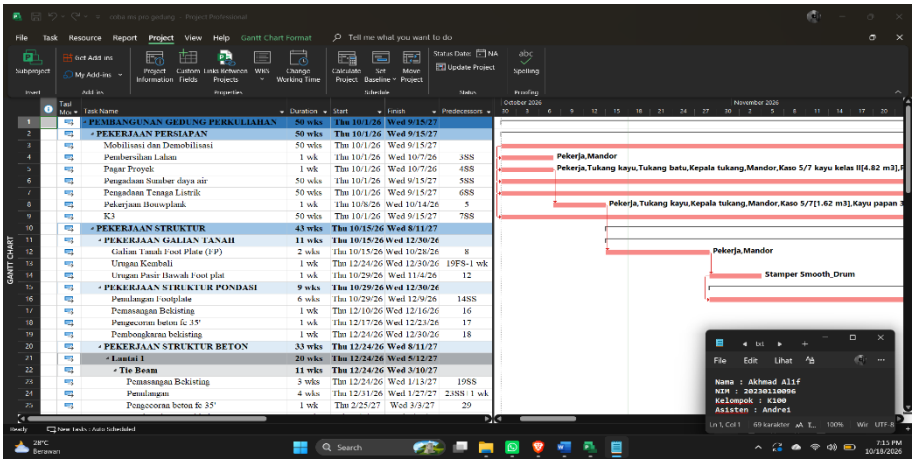


Gambar 3. 24 Menampilkan Lintasan Kritis Pada *Gantt Chart*

3.5 Progress Lines

3.5.1 Menginput kolom *% Complete*

Untuk Mengetahui progress rencana dari pekerjaan secara keseluruhan. Kita perlu menginput kolom *% complete* dengan cara klik *add new column* dan ketikan *% complete* lalu tekan *enter* pada *keyboard*.

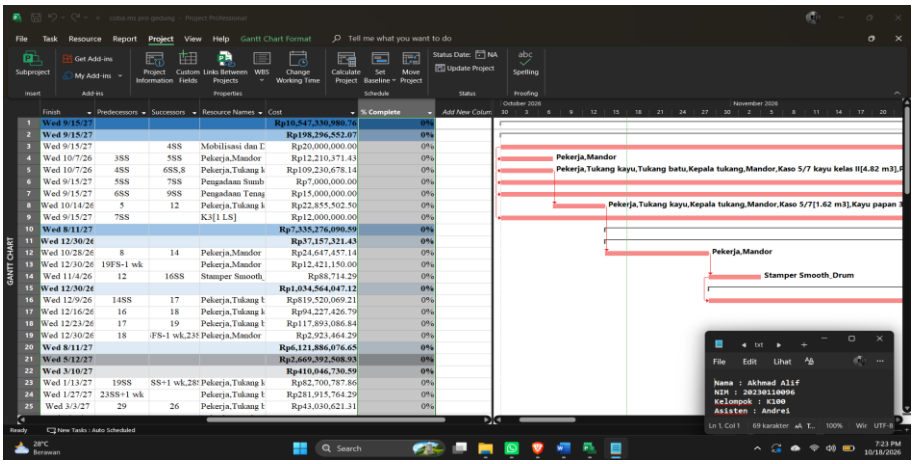


Gambar 2. 25 Tampilan setelah input kolom *% complete*

3.5.2 Update Project

Perintah *Update Project* digunakan untuk memunculkan persentase progres pekerjaan yaitu pada kolom % complete. Kasus sekarang, direncanakan untuk pemantauan target pelaksanaan pada minggu ke (Isi angka minngu ke- masing2 bidang), langkah - langkah nya adalah sebagai

berikut:

1. Klik *menu project*.
2. Klik perintah *update project*.
3. Pilih *update work as complete through* (perbarui pekerjaan yang benar benar telah terjadi, berdasarkan bagaimana proyek tersebut dijadwalkan), kemudian masukkan tanggal (isi tanggal masing2 bidang).
4. Pilih set 0 % - 100 % *complete* (agar persentasi project dalam rentang 0 sampai 100%).
5. Pilih *entire project* agar cakupan *update project* merupakan keseluruhan *project*.
6. Klik *OK*.

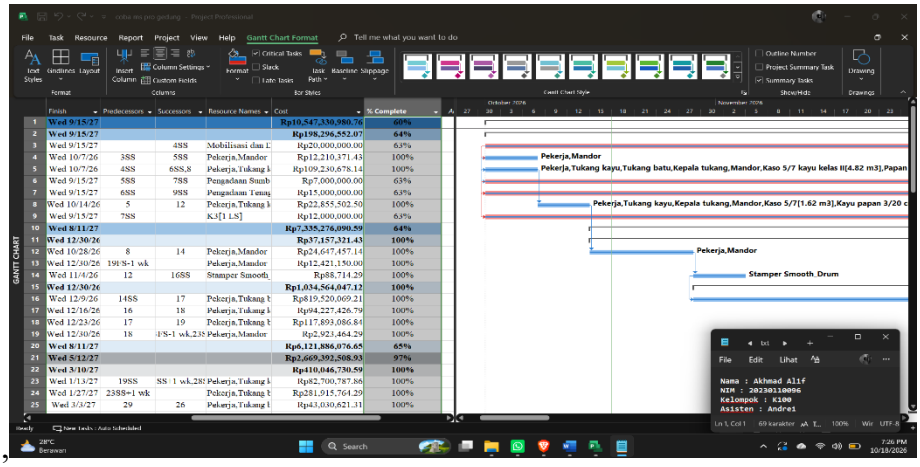


Gambar 2. 26 Tampilan kolom *% complete* setelah *update project*

3.5.3 Menginput kolom *Cost* dan *Physical % Complete* dan melakukan *update project* kembali


Selanjutnya kita perlu menginput kolom *physical % complete* dengan cara klik *add new column* ketikan *physical % complete* dan tekan enter pada *keyboard*. Kemudian pada kolom *physical % complete*:

1. Pada pekerjaan di minggu ke (isi sesuai bidang proyek) yang progresnya sudah 100% dan pekerjaan yang belum mulai atau masih 0% diinput kembali ke dalam kolom *physical % complete*.
2. Pekerjaan yang sedang berjalan (diantara 0-100%) dilakukan pengurangan persentase pekerjaan sebesar 3%, dan nilainya di input ke dalam kolom *physical % complete*.

3. Pekerjaan yang sedang berjalan (diantara 0-100%) tapi durasinya dari mencakup minggu awal sampai minggu akhir proyek diinput kembali di kolom *physical % complete*.

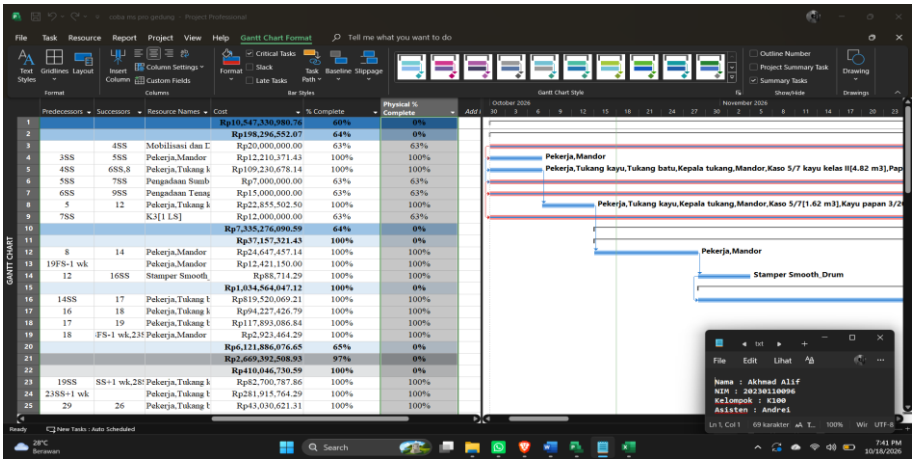


Gambar 3. 27 Pengisian *physical % complete*

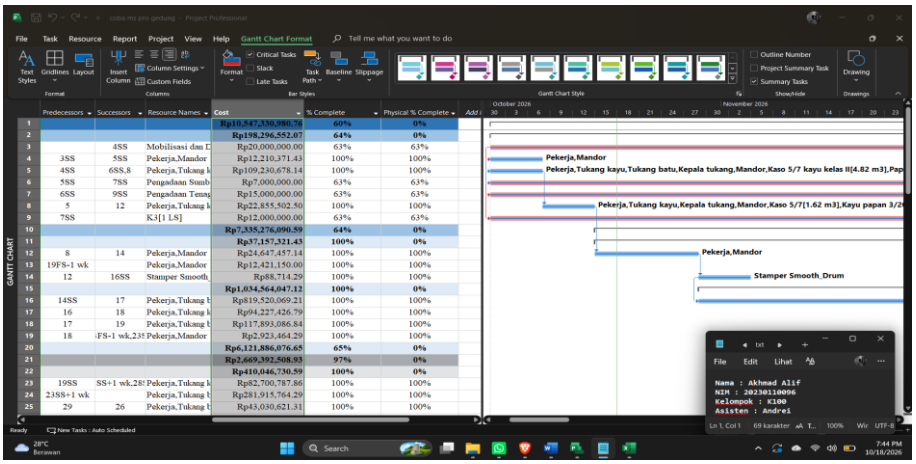

Gambar 3. 27 penginputan kolom *cost.*


Setelah itu, dilakukan *update project* kembali untuk memperbarui progress pekerjaan dengan cara yang sama seperti sebelumnya.

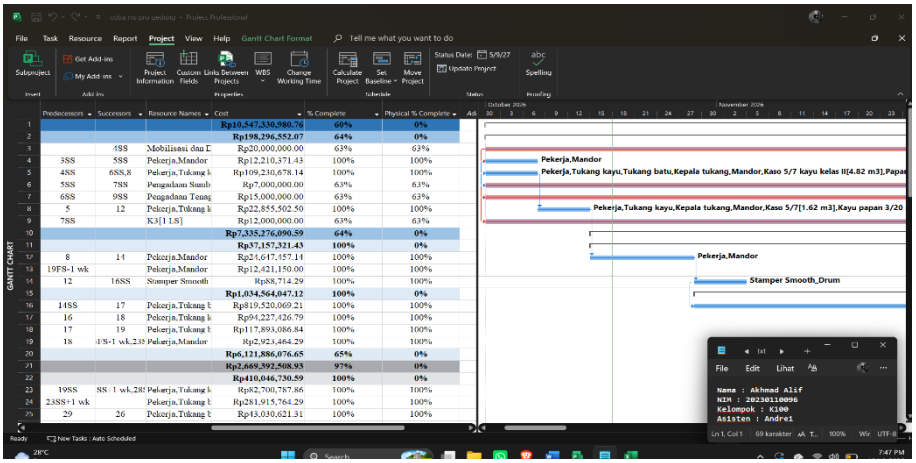

Gambar 3. 28 tampilan *gantt chart* setelah *update project* kembali.

3.5.4 Mengedit Bar Styles


Kemudian atur *bar style* dengan cara klik kanan pada *gantt chart*, pilih *barstyles*, kemudian pilih text sepetri gambar 3.29. Pada bagian *Top* pilih % *Complete*, pada bagian *Bottom* pilih *Physical* % *Complete*, kemudian klik

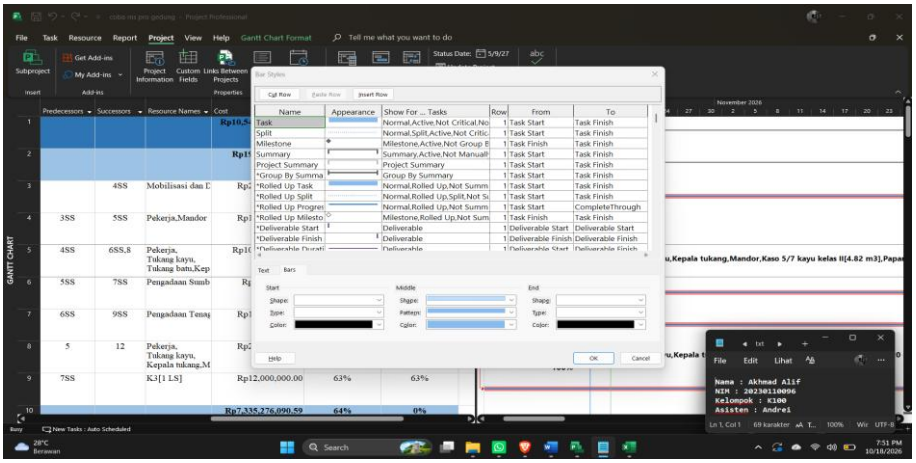

Gambar 3. 29 Tampilan setelah mengedit *Bar Styles*

3.5.5 Menampilkan *Progres Line*

Untuk memunculkan *progress line* klik kanan pada *gantt chart* kemudian klik *progressline*, setelah menu muncul seperti gambar 3.29 centang bagian *display* kemudian kik *OK*.

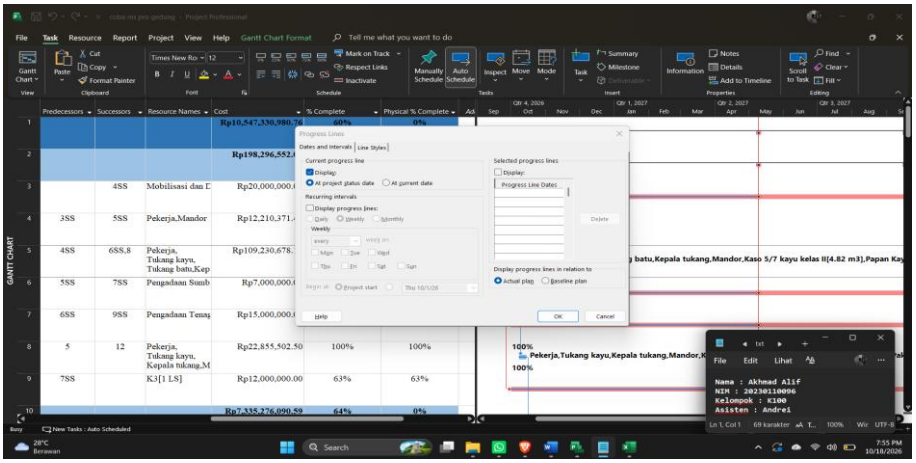


Gambar 3. 30 Tampilan *Progress Line*

BAB IV

REPORT

Microsoft Office Project menyediakan fasilitas membuat laporan (Report) dengan mudah. Ada dua macam bentuk laporan pada *Ms. Project* yaitu *Report* (Laporan dalam bentuk tabel atau teks, yaitu *Overview, Current Activity, Cost, Assignment, Workload*, dan *Custom*. Untuk membuat laporan proyek, langkah - langkahnya adalah sebagai berikut :


a. Klik *ikon reports*. Maka akan muncul kotak dialog seperti gambar 4.1. Kemudian pilih *Dashboard, Resources, Cost* dan *In Progress*.

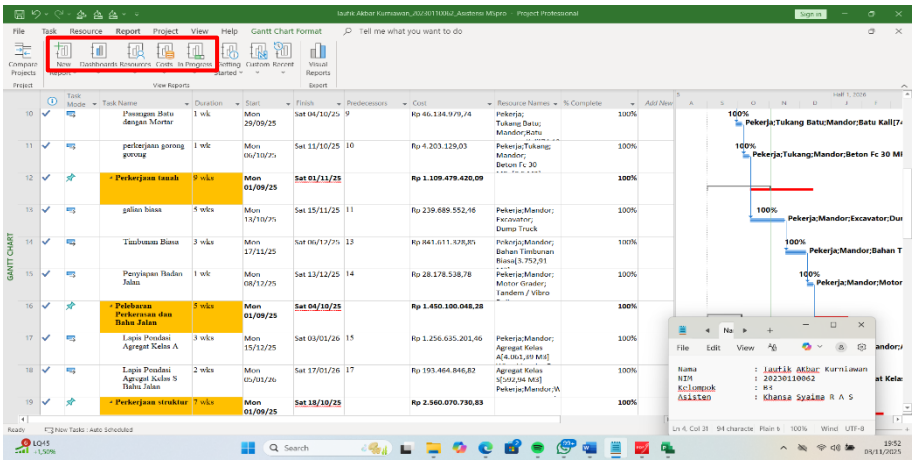

Gambar 4. 1 Tampilan Kotak Dialog Report

4.1 Cost Overview


Cost overview merupakan laporan gambar umum proyek yang merupakan bentuk laporan teks dan grafik. Cara menampilkannya hanya cukup klik *report* kemudian klik dashboard, lalu pilih *Cost Overview*.

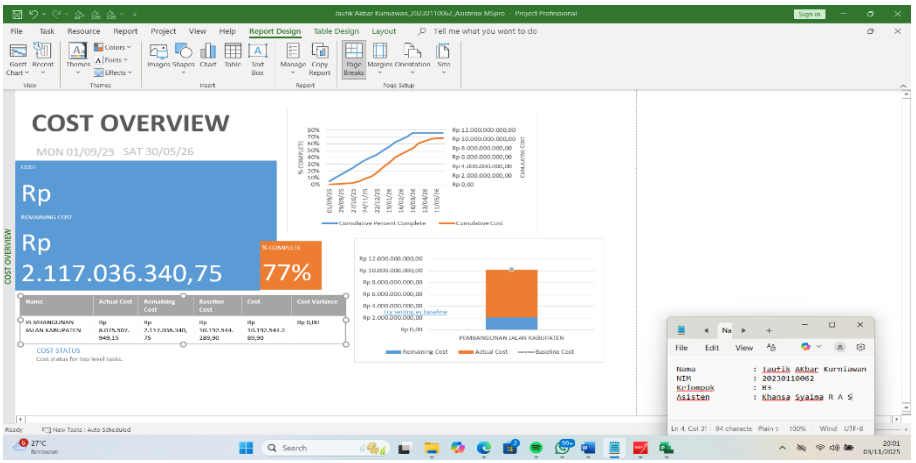

Gambar 4. 2 Tampilan dari Cost Overview

4.2 Project Overview


Project Overview merupakan laporan aktivitas atau tugas-tugas proyek yang akan harusnya sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Cara menampilkannya hanya cukup klik *report* kemudian klik *dashboard*, lalu pilih *Project Overview*. Terlihat pada Gambar 4.3.

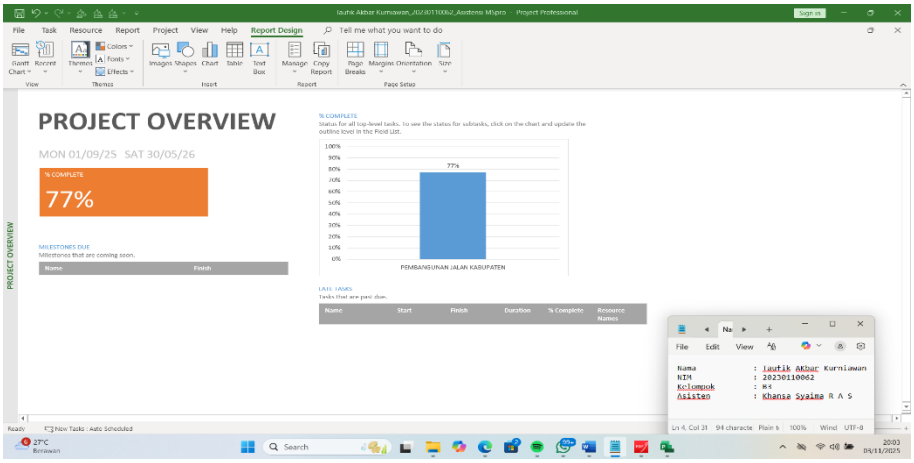

Gambar 4. 3 Tampilan dari Project Overview

4.3 Upcoming task


Upcoming Task merupakan laporan progress pekerjaan yang terlaksana sesungguhnya di lapangan. Cara menampilkannya klik *report* kemudian klik *dashboard*, lalu pilih *Upcoming Task*.

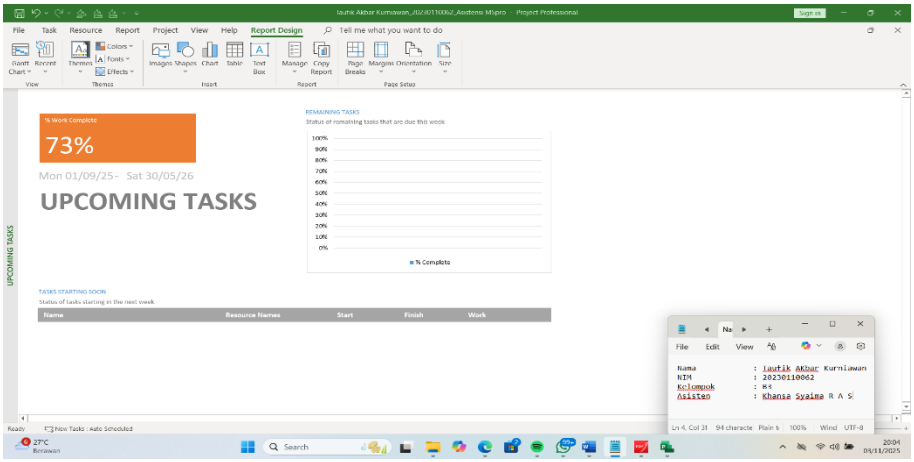

Gambar 4. 4 Tampilan dari Upcoming Task

4.4 Work Overview


Work Overview merupakan laporan pekerjaan yang sudah terlaksana di lapangan, sehingga kita dapat mengetahui berapa pekerjaan yang sudah terlaksana dan berapa sisa pekerjaannya. Cara menampilkannya klik *report* kemudian klik *dashboard*, lalu pilih *Work Overview*.

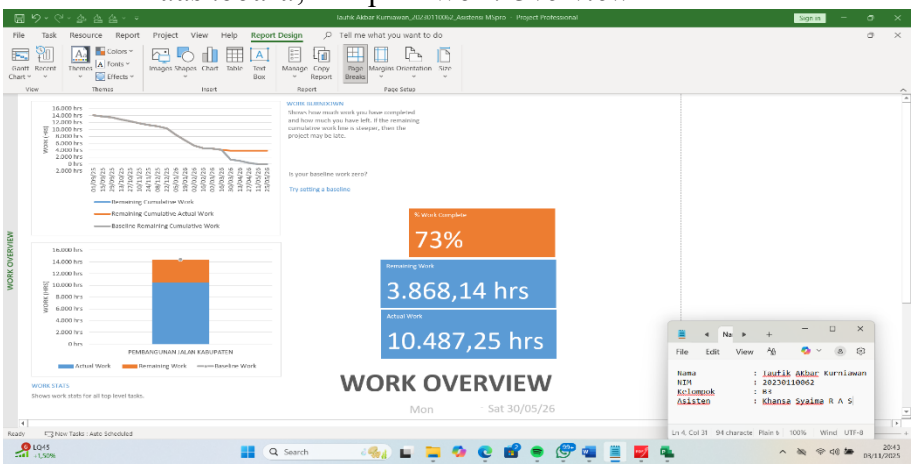

Gambar 4. 5 Tampilan dari Work Overview

4.5 Overallocated Resources


Overallocated Resources merupakan laporan untuk mengetahui beban pekerjaan yang berlebih disetiap sumber daya proyek. Cara menampilkan report kemudian klik *resources*, lalu pilih *Overllocated Resources.*

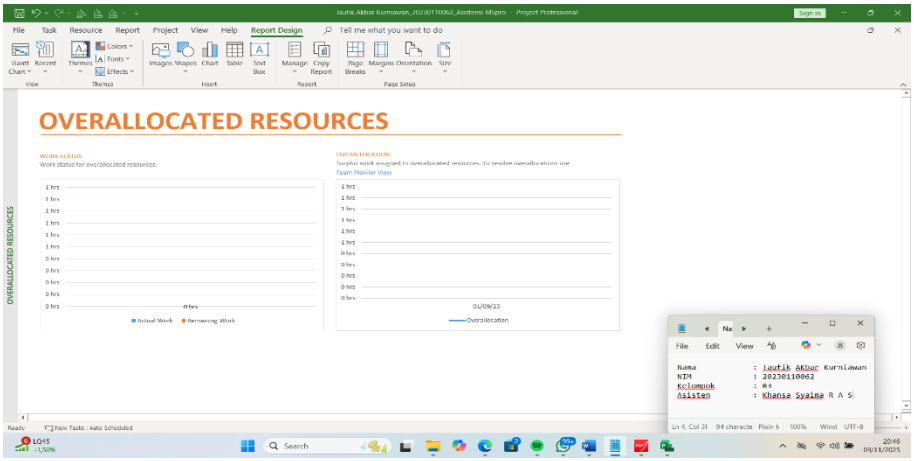

Gambar 4. 6 Tampilan dari Overallocated Resources

4.6 Resources Overview


Resources overview adalah laporan yang menunjukkan beban setiap sumber daya proyek beserta sisa beban pekerjaannya hingga pekerjaan berakhir. Cara menampilkannya klik *report* kemudian klik *resources*, lalu pilih *Resources overview*.

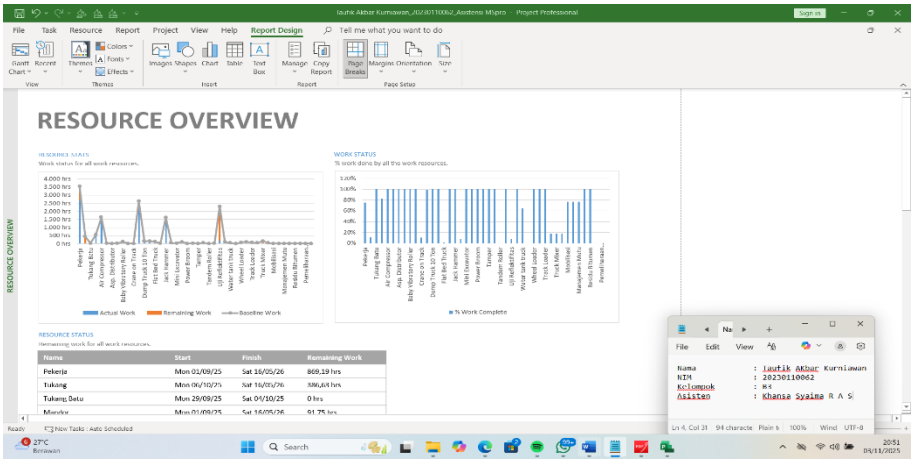

Gambar 4. 7 Tampilan dari Resources Overview

4.7 Cash Flow


Cash Flow adalah laporan yang menunjukkan aliran keuangan dalam pekerjaan tersebut. Cara menampilkannya klik report kemudian klik *cost*, lalu pilih *Cash Flow*. Terlihat pada Gambar 4.8.

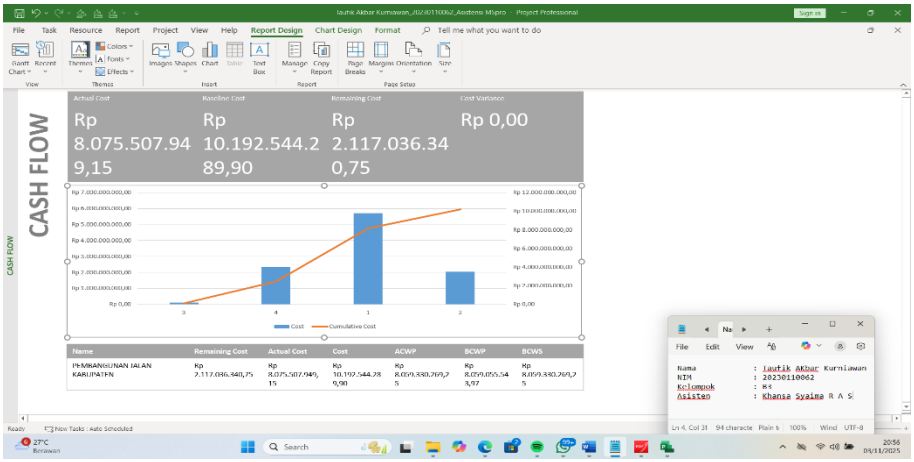

Gambar 4. 8 Tampilan dari Cash Flow

4.8 Earned Value Report


Earned Value Report digunakan untuk membantu mengukur kinerja suatu proyek, dengan membandingkan biaya dan jadwal dengan garis dasar untuk menentukan apakah proyek sesuai rencana. Cara menampilkan klik *report* kemudian klik *cost*, lalu pilih *Earned Value Report*.

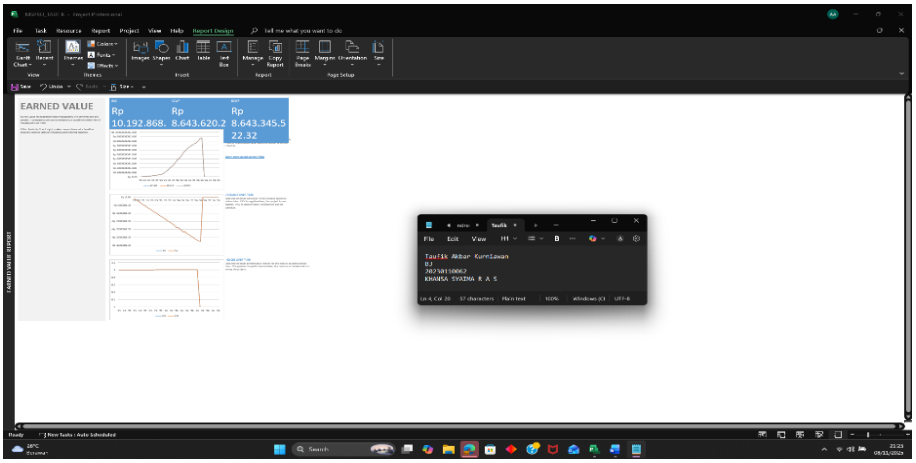

Gambar 4. 9 Tampilan dari Earned Value Report

4.9 Critical Task

Critical Task adalah tugas yang keterlambatan pelaksanaannya akan menyebabkan penundaan tanggal penyelesaian proyek. Cara menampilkan dengan cara klik *report,* kemudian klik *in progress* lalu pilih *critical tasks.*

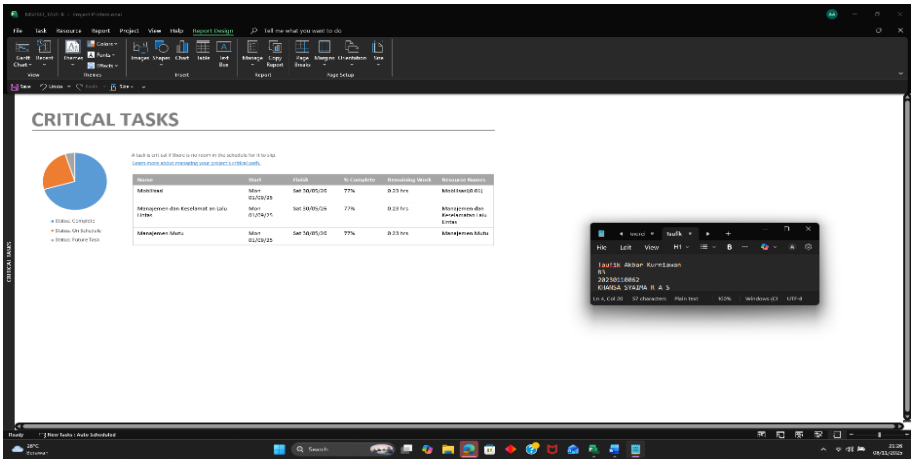

Gambar 4. 10 Tampilan dari *Critical Task*
